

坂田地区の埋立事業にともなう放射線量の測定結果について（12月分）

坂田地区で行われている埋立事業に関連して、「館山港」と「埋立現場」で測定した搬入土砂の放射線量についての結果を報告します。

数値については、除染の基準とされる数値（0.23 マイクロシーベルト毎時）と比較しても、問題となる数値ではありませんでした。

記

〈館山港での測定〉

- ①測定方法 館山港に積み降ろされる「搬入土砂」について、船ごとに事業者が測定し、測定結果が、月に1度に市に報告される。
- ②測定機器 シンチレーション式サーベイメータ  
（日立アロカメディカル社製 TSC-172B）  
※館山市が使用する測定器と同タイプ
- ③測定結果 別添のとおり（0.02～0.05 マイクロシーベルト毎時）

〈埋立現場での測定〉

- ①測定方法 月に1度、館山市職員が、市の測定器（県から借用している）を使用し、埋立現場で測定する。
- ②測定日 平成27年1月29日（木）
- ③測定結果 高さ1メートル：0.04 マイクロシーベルト毎時  
高さ50センチメートル：0.04 マイクロシーベルト毎時
- ②測定機器 シンチレーション式サーベイメータ  
（日立アロカメディカル社製 TSC-172B）

〈参考〉

○除染の基準値：0.23 マイクロシーベルト毎時

追加被曝線量が、年間1ミリシーベルト以下になることを目指し、そこから逆算し求められた数値、環境省から示されている。

# 荷揚船放射線量測定一覽表(館山港)

平成26年 12月


日付	船名	放射線量	備考	日付	船名	放射線量	備考
12月 1日	第15住力丸	μ Sv/h	欠測	12月 16日	第8光徳丸	0.02 μ Sv/h	
12月 6日	大福丸	0.05 μ Sv/h		12月 16日	第3伊勢丸	μ Sv/h	欠測
12月 6日	第15住力丸	0.05 μ Sv/h		12月 16日	第15住力丸	μ Sv/h	欠測
12月 6日	第8大福丸	0.04 μ Sv/h		12月 19日	第15住力丸	0.04 μ Sv/h	
12月 7日	第8光徳丸	0.03 μ Sv/h		12月 19日	第8白山丸	0.04 μ Sv/h	
12月 8日	第8白山丸	0.02 μ Sv/h		12月 22日	第3伊勢丸	0.04 μ Sv/h	
12月 9日	第8光徳丸	0.03 μ Sv/h		12月 23日	第3伊勢丸	0.04 μ Sv/h	
12月 9日	第3伊勢丸	0.03 μ Sv/h		12月 23日	第8光徳丸	μ Sv/h	欠測
12月 10日	第25勝丸	0.02 μ Sv/h		12月 25日	第15住力丸	0.04 μ Sv/h	
12月 10日	第15住力丸	0.02 μ Sv/h		12月 25日	第3伊勢丸	0.04 μ Sv/h	
12月 10日	第18都丸	μ Sv/h	欠測	12月 26日	第3伊勢丸	0.03 μ Sv/h	
12月 10日	第8光徳丸	μ Sv/h	欠測	12月 26日	第8光徳丸	μ Sv/h	欠測
12月 12日	大福丸	0.02 μ Sv/h		12月 27日	第15住力丸	0.02 μ Sv/h	
12月 12日	第15住力丸	0.05 μ Sv/h					
12月 12日	第8光徳丸	0.05 μ Sv/h					
12月 12日	第18都丸	μ Sv/h	欠測				
12月 14日	第15住力丸	0.04 μ Sv/h					
12月 15日	第8白山丸	0.04 μ Sv/h					
12月 15日	大福丸	0.04 μ Sv/h					
12月 15日	第3伊勢丸	0.04 μ Sv/h					
					平均	0.035 μ Sv/h	

盛土現場内放射線量測定

0.03 μ Sv/h


大福丸 平成26年12月6日 (土)



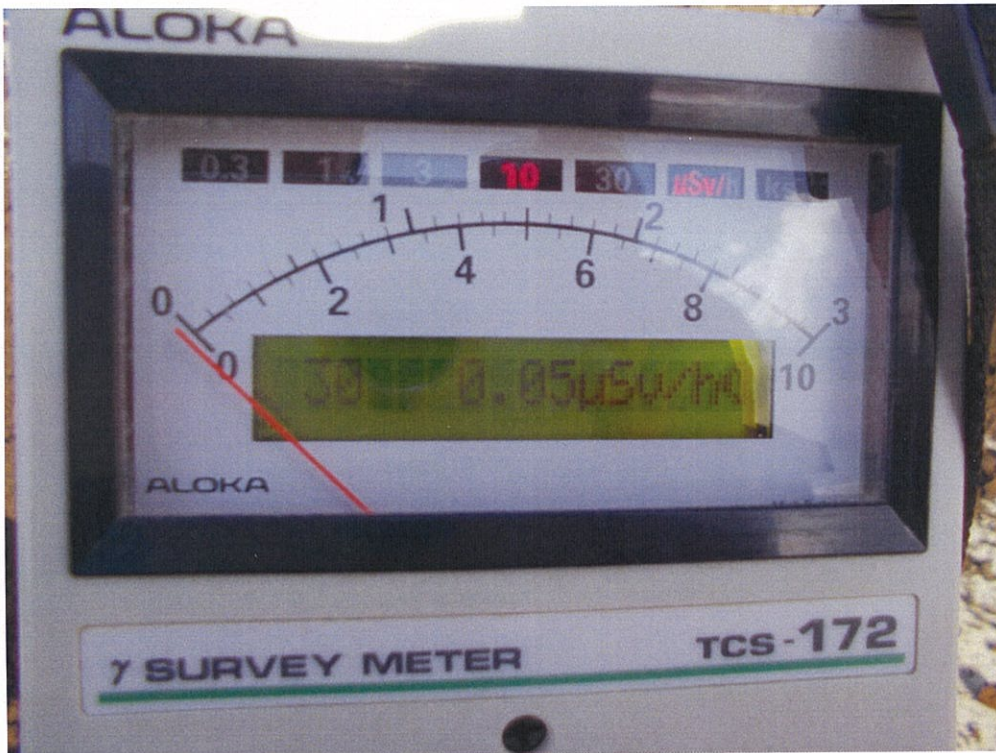

【埋立現地 放射線量測定 平成27年1月29日測定】

値は0.04マイクロシーベルト(1.0m計測時)

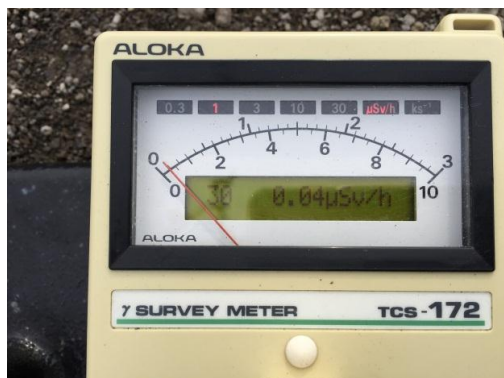

値は0.04マイクロシーベルト(0.5m計測時)

